



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

Febrero 2018

UNIDAD EJECUTORA N° 2C

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	3
2. OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD EN ZONAS RURALES.....	4
2.1 PLAN DE CAMINERIA RURAL.....	4
2.2 AVANCE MENSUAL DEL PLAN DE CAMINERIA RURAL.....	5
3. OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD EN ZONAS URBANAS.....	6
3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO POR RUBRO/POR MUNICIPIO.....	7
3.2 AVANCE DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD EN ZONAS URBANAS: TOTALES POR UNIDAD EJECUTORA.....	8
4. TABLA PERFILADO URBANO UE.....	10
5. RUBROS EJECUTADOS POR LOCALIDAD.....	11
6. PROYECTOS.....	12
7. COMUNICACIÓN.....	13

1.RESUMEN

1-LAS VEGAS NORTE

Perfilado y Limpieza de cunetas

Colocación de caños

2-BELLO HORIZONTE

Colocación de caños

Limpieza y nivelación

Construcción de firme

Construcción de Columna

3- SAN LUIS

Perfilado

4- LOS TITANES

Construcción de Badén

5- SOCA

Perfilado y limpieza de cunetas

6-CAPILLA DE CELLA

Recargo

7- PIEDRAS DE AFILAR

Recargo

2- OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD EN ZONAS RURALES

- 1-Camino 111 Mantenimiento Ordinario
- 2-Camino 112 Mantenimiento Ordinario
- 3-Camino 113 Mantenimiento Ordinario
- 4-Camino 113a Mantenimiento Ordinario
- 5-Camino 113 b Mantenimiento Ordinario
- 6- Camino 049c Mantenimiento Ordinario

2.1 PLAN DE CAMINERIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA 2c - Región 8							
Región	Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes planificado
8	La Floresta	111a	Camino de la Torta Frita	Ruta 35	R. Interbalnearia	7,8	junio
		111b	Pueblo Chico	Tramo 111a	R. Interbalnearia	1,3	junio
		111c		Las Vegas Norte	109a	2,7	julio
	Soca	194	a Minas	193	047b	4,9	marzo
		195	de los Cerros	Tramo 194	Soca	10,2	abril
		049c	Villalba	Tramo 49d	Ruta 8	5,9	marzo
		110	0	Ruta 9	Ruta Interbalnearia	10,6	enero
		110a	0	Tramo 110	Vía Férrea	5,6	enero
		111	0	Tramo 110	Tramo 111a	4,5	enero
		112	Cno. Solís Grande	R9	112++	3,3	febrero
		109f	0	Cno. 109	Al Norte	1,0	mayo
		113	Ruta 70	R9	113b	5,5	febrero
		113b	0	Tramo 113	A ruta Interbalnearia	4,4	febrero
		109	Cno. Del Cementerio	Soca	Ruta 9	11,5	mayo
		113a	0	Tramo 113/R.9	Ruta 9/Al Este	1,3	febrero
		109g	0	Ruta 9	Al Sur	1,8	mayo
195a1	0	Ruta 8	Al norte	0,5	abril		

82,6


3.2 AVANCE DE OBRAS MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD EN ZONAS URBANAS: TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA

TABLA 2: PERFILADO URBANO EJECUTORA 2 C

	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Previsto	20,7	14,5	10,8	10,7	14,3	8,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6
Ejecutado	17,14	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3

GRÁFICA 1 - Avance mensual Previstos y Ejecutados Caminería Rural

Unidad Ejecutora 2C

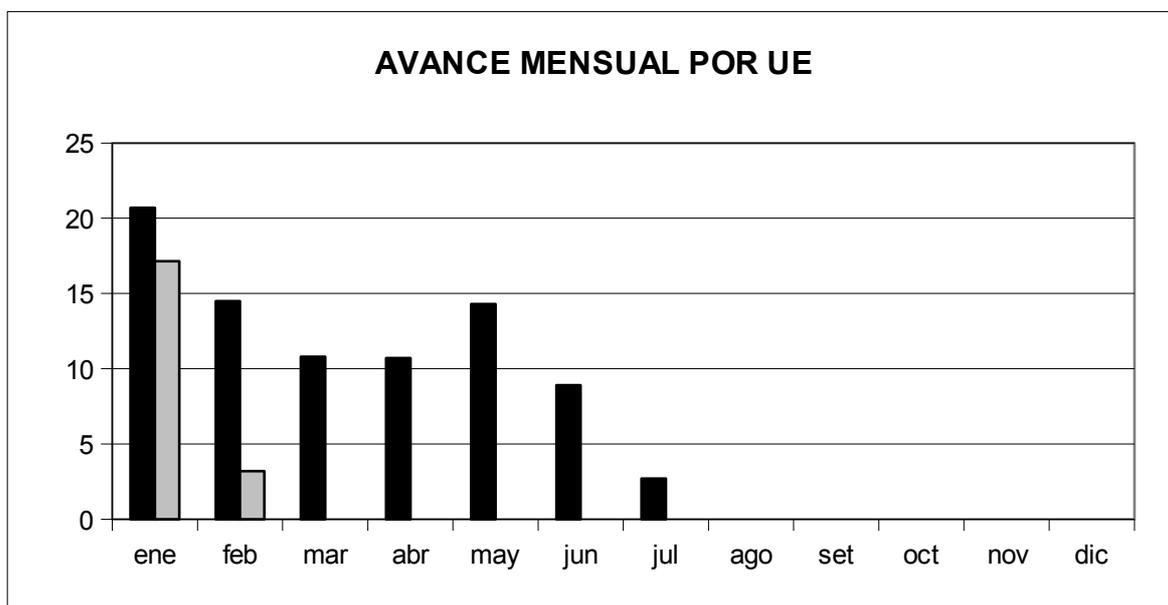

2.3 CAMINOS EJECUTADOS EXTRA PLAN

1- Camino 109 a++ Mantenimiento Ordinario

2- Camino 113 a+ Mantenimiento Ordinario

Informe Mensual de Gestión – Febrero 2018

Dirección General de Obras – Gobierno de Canelones

3.0 OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD EN ZONAS URBANAS

Se describe el avance de los Proyectos Integrales de Infraestructura, de los Proyectos de Consolidación de Barrios y del Plan de Mantenimiento recurrente de infraestructura.

1- LAS VEGAS NORTE

Calle 9

Calle 140

Calle 8

2-BELLO HORIZONTE

Calle Av. 1

3- SAN LUIS

Calle Diag. Hondura

4-LOS TITANES

Calle Rio de Janeiro

5-SOCA

Calle 6

Calle 7

Calle 3

Calle 5

Calle Rivera

Calle Artigas

Calle Aparicio Saravia

Calle 4

Calle 2

Calle 12 de Octubre

Calle Zenon Burgueño Hijo

Calle Barrio Escarpin

6-CAPILLA CELLA

Calle 17 mts

Calle Paralela a Ruta 9

Calle Destacamento de Republicana

7- PIEDRAS DE AFILAR

Calle Alvares

Calle Berisso

Informe Mensual de Gestión – Febrero 2018

Dirección General de Obras – Gobierno de Canelones

3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO POR RUBRO/POR MUNICIPIO

MUNICIPIO LA FLORESTA PREVISTO/EJECUTADO 2018

Cód.	RUBROS	Un	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
			PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT
1.0	Limpieza de cunetas	m	1000	2700	1000	2600	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0
2.0	Perfilado (ancho 5 mts. mínimo)	m2	11000	21750	11000	9000	11000	0	1000	0	1000	0	1000	0
3.0	Tendido de tosca	m3	1000	1066	1000	66	1200	0	1200	0	1200	0	1200	0
4.0	Escarificado	m2	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0
5.0	Colocación de caños	ml	18	0	30	7	30	0	30	0	30	0	30	0
6.0	Limpieza de caños	u	20	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0
7.0	Colocación de losetas	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0	Bacheo en tosca	m3	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0
8.1	Bacheo en asfalto con base	m2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1	Bacheo en asfalto sin base	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Bacheo en hormigón	m2	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	25	0
8.3	Bacheo con premezclado/frezado	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Bacheo con tosca cementada	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.0	Limpieza de cañadas	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.0	Conformación de calle o camino	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.0	Construcción de rampas	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.0	Construcción de cabezales	u	4	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
13.0	Construcción de cordón cuneta	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.0	Construcción de badén	m3	0	0	0	1,5	1	0	0	0	1	0	1	0
15.0	Tratamiento bituminoso simple	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.0	Camara receptora de pluviales	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.0	Apertura de Calle	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE SOCA PREVISTO/EJECUTADO 2018

Cód.	RUBROS	Un	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
			PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT	PREV	EJECUT
1.0	Limpieza de cunetas	m	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0	Perfilado (ancho 5 mts. mínimo)	m2	0	0	500	12750	0	0	0	0	500	0	0	0
3.0	Tendido de tosca	m3	0	0	600	72	0	0	0	0	600	0	0	0
4.0	Escarificado	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.0	Colocación de caños	ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0	Limpieza de caños	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0	Colocación de losetas	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0	Bacheo en tosca	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Bacheo en asfalto con base	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1	Bacheo en asfalto sin base	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Bacheo en hormigón	m2	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Bacheo con premezclado/frezado	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Bacheo con tosca cementada	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.0	Limpieza de cañadas	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.0	Conformación de calle o camino	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.0	Construcción de rampas	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.0	Construcción de cabezales	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.0	Construcción de cordón cuneta	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.0	Construcción de badén	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.0	Tratamiento bituminoso simple	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.0	Camara receptora de pluviales	u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.0	Apertura de Calle	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informe Mensual de Gestión – Febrero 2018


Dirección General de Obras – Gobierno de Canelones

3.2 AVANCE DE OBRAS MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD EN ZONAS URBANAS: TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA

TABLA 2: PERFILADO URBANO EJECUTORA 2 C

	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Previsto	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	72,0
Ejecutado	4,35	4,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,7

GRÁFICA 2 – Perfilado Urbano por mes Unidad Ejecutora 2C Febrero 2018.

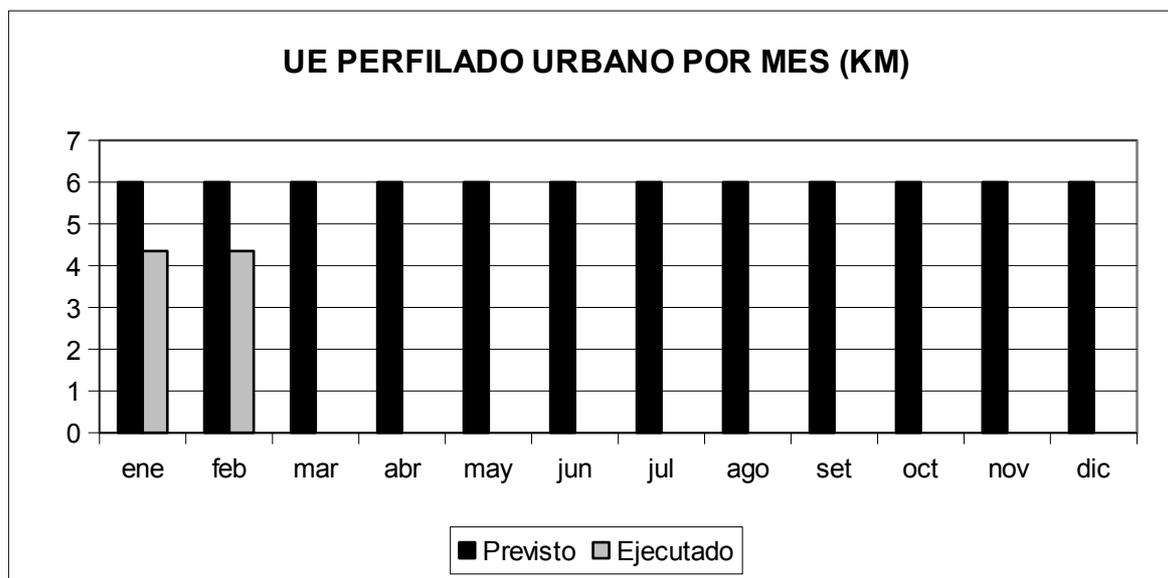

GRÁFICA 3 – Limpieza de Cunetas Acumulado Unidad

Ejecutora 2C Febrero 2018

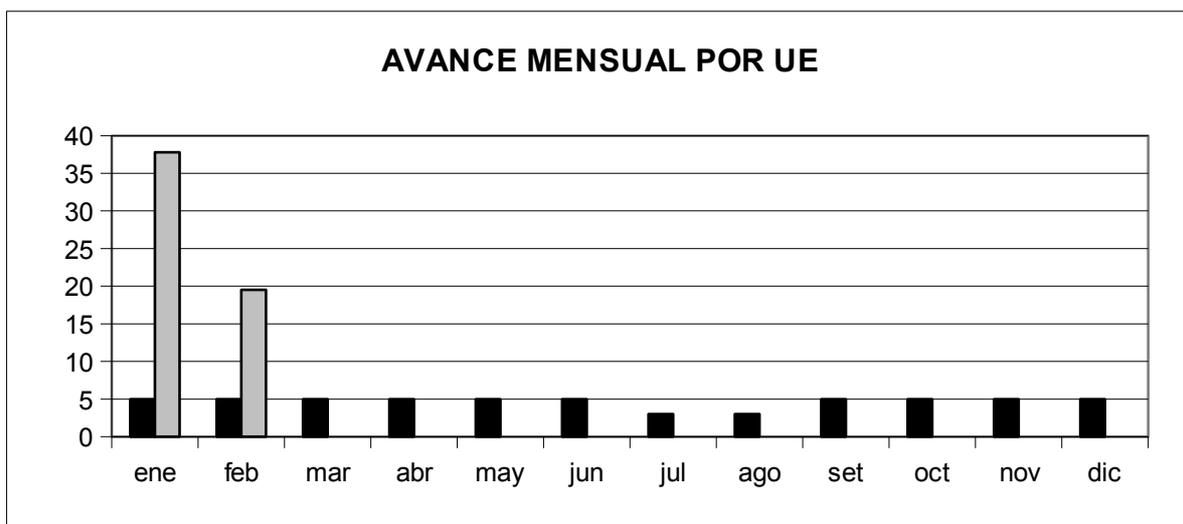


TABLA 4: PERFILADO URBANO UE

RUBROS EJECUTADOS	TOTAL
Balasto m3 urbano	138
Balasto m3 Rural	210
Balasto m3 Rural Fuera del Plan	76
Perfilado m2 Urbano	21750
Limpieza de cunetas Urbano m/l	3100
Limpieza de cunetas Rural m/l	16400
Caños	7
Portland	47
Arena m3	2
Pedregullo m3	3,5
Malla electrosoldada m2	0

TABLA 5: RUBROS EJECUTADOS POR LOCALIDAD

MUNICIPIO LA FLORESTA

LA VEGAS NORTE

TAREA	UNIDAD	RENDIMIENTO	TOSCA	OTROS MATERIALES
Perfilado	m2	8050		
Limpieza de cunetas	M/l	2600		
Colocacion de caños	M/l	6	18	Portland 15 sacos, 3 caños de 500

BELLO HORIZONTE

TAREA	UNIDAD	RENDIMIENTO	TOSCA	OTROS MATERIALES
Colocacion de caños	M/l	4	18	
Construccion de firme			30	
Construccion de columnas	unidad	3		Portland 25, Arena 1 m3 y 2 m3 de Pedregullo

SAN LUIS

TAREA	UNIDAD	RENDIMIENTO	TOSCA	OTROS MATERIALES
Perfilado	m2	1000		

LOS TITANES

TAREA	UNIDAD	RENDIMIENTO	TOSCA	OTROS MATERIALES
Construcción de Baden	m3	1,5		Potland 17 sacas, Arena 1 m3 y 1,5 de Pedregullo

SOCA

TAREA	UNIDAD	RENDIMIENTO	TOSCA	OTROS MATERIALES
Perfilado	m2	12750		
Limpieza de cunetas	M/l	500		

CAPILLA CELLA

TAREA	UNIDAD	RENDIMIENTO	TOSCA	OTROS MATERIALES
Tendido de Balasto	m3	150	54	

PIEDRAS DE AFILAR

TAREA	UNIDAD	RENDIMIENTO	TOSCA	OTROS MATERIALES
Tendido de Balasto	m3	55	18	

6 PROYECTOS

Se deben describir los proyectos de consolidación de barrios, pavimentación de conectores y caminos primarios, entre otros.

ESTACION LA FLORESTA

Limpieza de cunetas

BELLO HORIZONTE

Continuacion con tareas de acondicionamiento de Corralon Nuevo

CAMINERIA RURAL

Camino 109 Colocacion caños

Camino 114 b colocacion de caños

Camino 194

Camino 149 c

Camino 110 b Extra Plan

7. COMUNICACIÓN

Se mantienen comunicaciones telefónicas a diario con los Alcaldes de Soca y La Floresta.

